



Inkoop specialistische jeugdhulp Regio IJsselland

Terugblik en en vooruitblik

2 december 2021

Agenda

- Doel en kaders
- Kennismaking en projectstructuur
- Aanpak vervolg project
- Terugblik 2021
- Vooruitblik 2021-2022
- Ophalen leerpunten
- Vervolgbijsenkomsten

Spelregels

- We zijn met een grote groep
- Graag microfoon uit (en aanzetten als je het woord krijgt)
- Reacties en vragen graag via de Chat in Teams
- Presentatie wordt nagezonden



Waar het niet goed is gegaan

- Tijdens het afgelopen inkooptraject is het niet gelukt om alle belangen en wensen tot een goed geheel te brengen waardoor uitstel de enige oplossing was.
- Het proces is in 2020 goed van start gegaan met veel gezamenlijke sessies maar de verbinding verslechterde naarmate de tijd verstreek.



Doel en kaders (1)

Doel voor het vervolgtraject:

Samen en in verbinding het inkooptraject vervolgen met ingangsdatum 1 januari 2023 door samen ervaringen te delen over het vorig inkooptraject en te zoeken naar oplossingen voor de doorstart van het inkooptraject.

Inkoopdoel:

Inkopen van kwalitatief en kwantitatief voldoende jeugdhulp op de onderdelen Ambulante Jeugdhulp en Wonen / Verblijf.

Doel bijeenkomst:

Toelichting op het proces (verleden en heden) en ophalen bezwaren en oplossingsrichtingen voor vervolg




Doel en kaders (2)

Kaders: wat betekent een doorstart van het inkooptraject?

- Inkoop richt zich op percelen Ambulante Jeugdhulp en Wonen / Verblijf
- Inkoop blijft binnen de kaders vanuit het uitvoeringsplan en inkoopstrategie tenzij dit echt niet anders kan
- Geen grote modelveranderingen maar aanscherpen en verbeteren waar dit nodig is
- Geen beperkingen van het aantal te contracteren aanbieders (blijft dus gelijk)
- Inschrijfvoorwaarden blijven zoveel mogelijk ongewijzigd
- Nvl deel 2 is nog niet beantwoord en wordt zoveel als mogelijk beantwoord, verwerkt en gedeeld met aanbieders



Kennismaking en projectstructuur

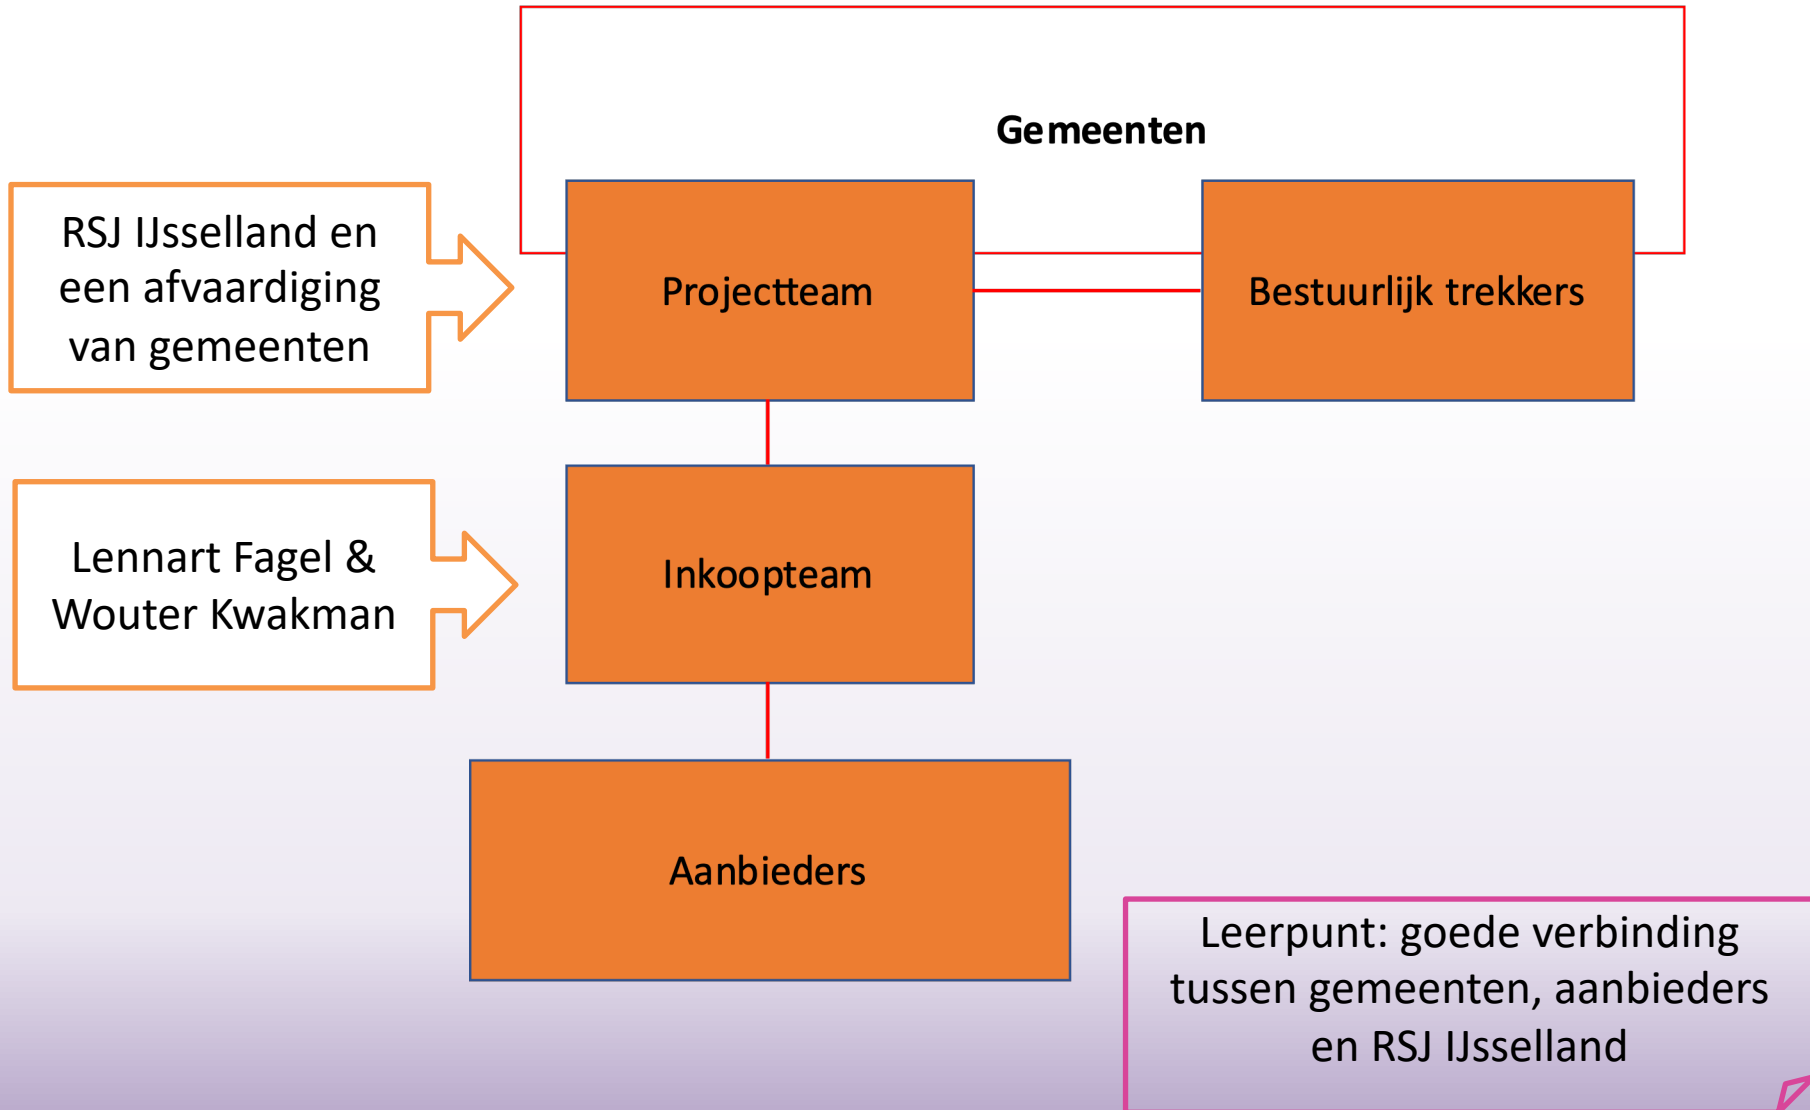



Aanpak vervolg project

Bestuurlijk traject

- gesprek met aanbieders, gemeenten en RSJ IJsselland onder begeleiding van OZJ
- Doel: vanuit een breder kader het gesprek aangaan over samenwerken binnen regio IJsselland
- Een afvaardiging van aanbieders neemt deel opgezet vanuit het OZJ

Ambtelijk traject

- gesprek met aanbieders en gemeenten onder begeleiding van RSJ IJsselland
- Doel: het zoeken naar knelpunten en oplossingen op inhoud en proces om de inkoop te kunnen vervolgen
- Aanbieders nemen allemaal deel aan algemene bijeenkomsten en er vinden individuele gesprekken met een kleinere groep aanbieders plaats



Terugblik 2021 (1)

Periode	Beschrijving
Januari 2021	- Ontbijtsessies met gemeenten over het doorontwikkeld inkoopmodel en de uitkomsten van het tarievenonderzoek
Februari 2021	- Verdiepende gesprekken met aanbieders over tarieven - Besluit op uitvoeringsplan en inkoopstrategie
Maart 2021	- Opstellen inkoopdocumenten
April 2021	- Start inkoopprocedure → exclusief tarieven - Startbijeenkomst aanbieders - Dialoogsessies op verschillende thema's waaronder zorglandschap (tariefdifferentiatie onderzoeken)
Mei 2021	- Publicatie nota van inlichtingen deel 1 - Publicatie nieuw inkoopdocument + tarieven
Juni 2021	- Besluitvorming over uitkomsten dialoogsessie zorglandschap (tariefdifferentiatie) - Veel vragen in NvI met grote bezwaren op tarieven en ontbreken tariefdifferentiatie - 30 juni, bestuurlijk besluit de aanbesteding terug te trekken



Terugblik 2021 (2)

Periode	Beschrijving
Juli 2021	<ul style="list-style-type: none">- Gesprekken met aanbieders werden ingepland- Aanbieders wilden niet in ambtelijk in gesprek en deden het verzoek om eerst bestuurlijk in gesprek te gaan onder begeleiding van OZJ
Augustus 2021	<ul style="list-style-type: none">- Uitwerken vervolgtraject en contacten met OZJ- Bestuurlijke gesprekken en
September 2021	<ul style="list-style-type: none">- Idem
Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none">- Besluitvorming op het doorlopen van een bestuurlijk en ambtelijk spoor- Uitgangspunt: eerst bestuurlijk in gesprek en daarna ambtelijk gesprek parallel vervolgen.
November 2021	<ul style="list-style-type: none">- Individuele gesprekken met aanbieders over bezwaren en oplossingsrichtingen inkooptraject- Algemene bijeenkomst over bezwaren en oplossingsrichtingen



Vooruitblik 2021-2022

Periode	Beschrijving
December 2021	<ul style="list-style-type: none"> - 2 december: algemene bijeenkomst proces en ophalen leerpunten en oplossingen - Afronding individuele gesprekken met aantal aanbieders - RSJ IJsselland levert eerste concept met overzicht bezwaren en oplossingen op
Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Twee gemeentelijke bijeenkomsten om concept te bespreken - Twee bijeenkomsten met kleinere groep aanbieders - Eén bijeenkomst voor alle geïnteresseerde aanbieders <p>Doel: samen aanscherpen en verbeteren concept versie</p>
Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Oplevering definitief document bezwaren en oplossingen - Besluitvorming op onderdelen van het document - Nadere praktische uitwerking van overige onderdelen van het document met aanbieders en gemeenten (thematische aanpak)
Maart 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Uitlooptmogelijkheid besluitvorming - Uitwerken aanpassingen en besluiten in inkoopdocument - Meedenken aanbieders op inkoopdocumenten? - Algemene bijeenkomst voor alle aanbieders voor terugkoppeling besluitvorming
April 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Start inkooptraject



Vervolgbijeenkomsten

Periode	Beschrijving
December 2021	<ul style="list-style-type: none"> - vandaag: algemene bijeenkomst proces en ophalen leerpunten en oplossingen - Afronding individuele gesprekken met aantal aanbieders - RSJ IJsselland levert eerste concept met overzicht bezwaren en oplossingen op
Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Twee gemeentelijke bijeenkomsten om concept te bespreken - Twee bijeenkomsten met kleinere groep aanbieders + afvaardiging van gemeenten - Eén bijeenkomst voor alle geïnteresseerde aanbieders <p>Doel: samen aanscherpen en verbeteren concept versie</p>
Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Oplevering definitief document bezwaren en oplossingen - Besluitvorming op onderdelen van het document - Nadere praktische uitwerking van overige onderdelen van het document met aanbieders en gemeenten (thematische aanpak)
Maart 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Uitloopmogelijkheid besluitvorming - Uitwerken aanpassingen en besluiten in inkoopdocument - Algemene bijeenkomst voor alle aanbieders voor terugkoppeling besluitvorming
April 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Start inkooptraject - Startbijeenkomst voor alle aanbieders <p>Overige planning volgt medio februari 2022</p>



Ophalen leerpunten (1)

Aanpak

- Wij zijn op zoek naar de belangrijkste/zwaar wegende bezwaren én oplossingen per thema.
- Geef je feedback in de chatfunctie weer
- Pas bij elke reactie toe: "naam organisatie" + reactie
- Wij dagen jullie uit om bij een bezwaar ook een oplossing te beschrijven. (zet dit in 1 chatbericht)
- Wij zullen er vandaag op hoofdlijnen doorheen lopen
- Alle reacties worden verzameld en gecategoriseerd meegenomen in het totaal overzicht
- Niet elke reactie zal leiden tot een oplossing



Ophalen leerpunten (2)

Thema 1: welke bezwaren en oplossingen leven ten aanzien van het proces wat doorlopen is?



Ophalen leerpunten (4)

Thema 2: welke bezwaren en oplossingen leven ten aanzien van de inhoud van de inkoopdocumenten voor het perceel ambulante jeugdhulp? (geen tarieven)



Ophalen leerpunten (5)

Thema 3: welke bezwaren en oplossingen leven ten aanzien van de inhoud van de inkoopdocumenten voor het perceel Wonen / Verblijf? (geen tarieven)



Ophalen leerpunten (6)

Thema 4: welke bezwaren en oplossingen leven er ten aanzien van de tarieven?



Afronding en afsluiting

Overzicht contactmomenten

Januari: **Meedenken over concept bezwaren en oplossingen**

- twee bijeenkomsten met kleine groep aanbieders
- één bijeenkomst voor alle aanbieders

Februari: **Themabijeenkomsten voor uitwerking oplossingen**

- selectie groepjes aanbieders op o.b.v. thema's

Maart: **Terugkoppeling besluitvorming**

- één bijeenkomst voor alle aanbieders

April: **Start inkoop**

- één bijeenkomst voor alle aanbieders



Deelnemers individuele gesprekken

- **Karakter**
- **Accare**
- **Dimence**
- **Autimaat**
- **AT-groep**
- **Trias**
- **Pactum**
- **Triade-Vitree**
- **Pluryn**
- **Ambiq**
